


Roadmap StUF

Henri Korver
StUF Regiegroep 4 juni 2015
La Vie, Utrecht


Roadmap StUF

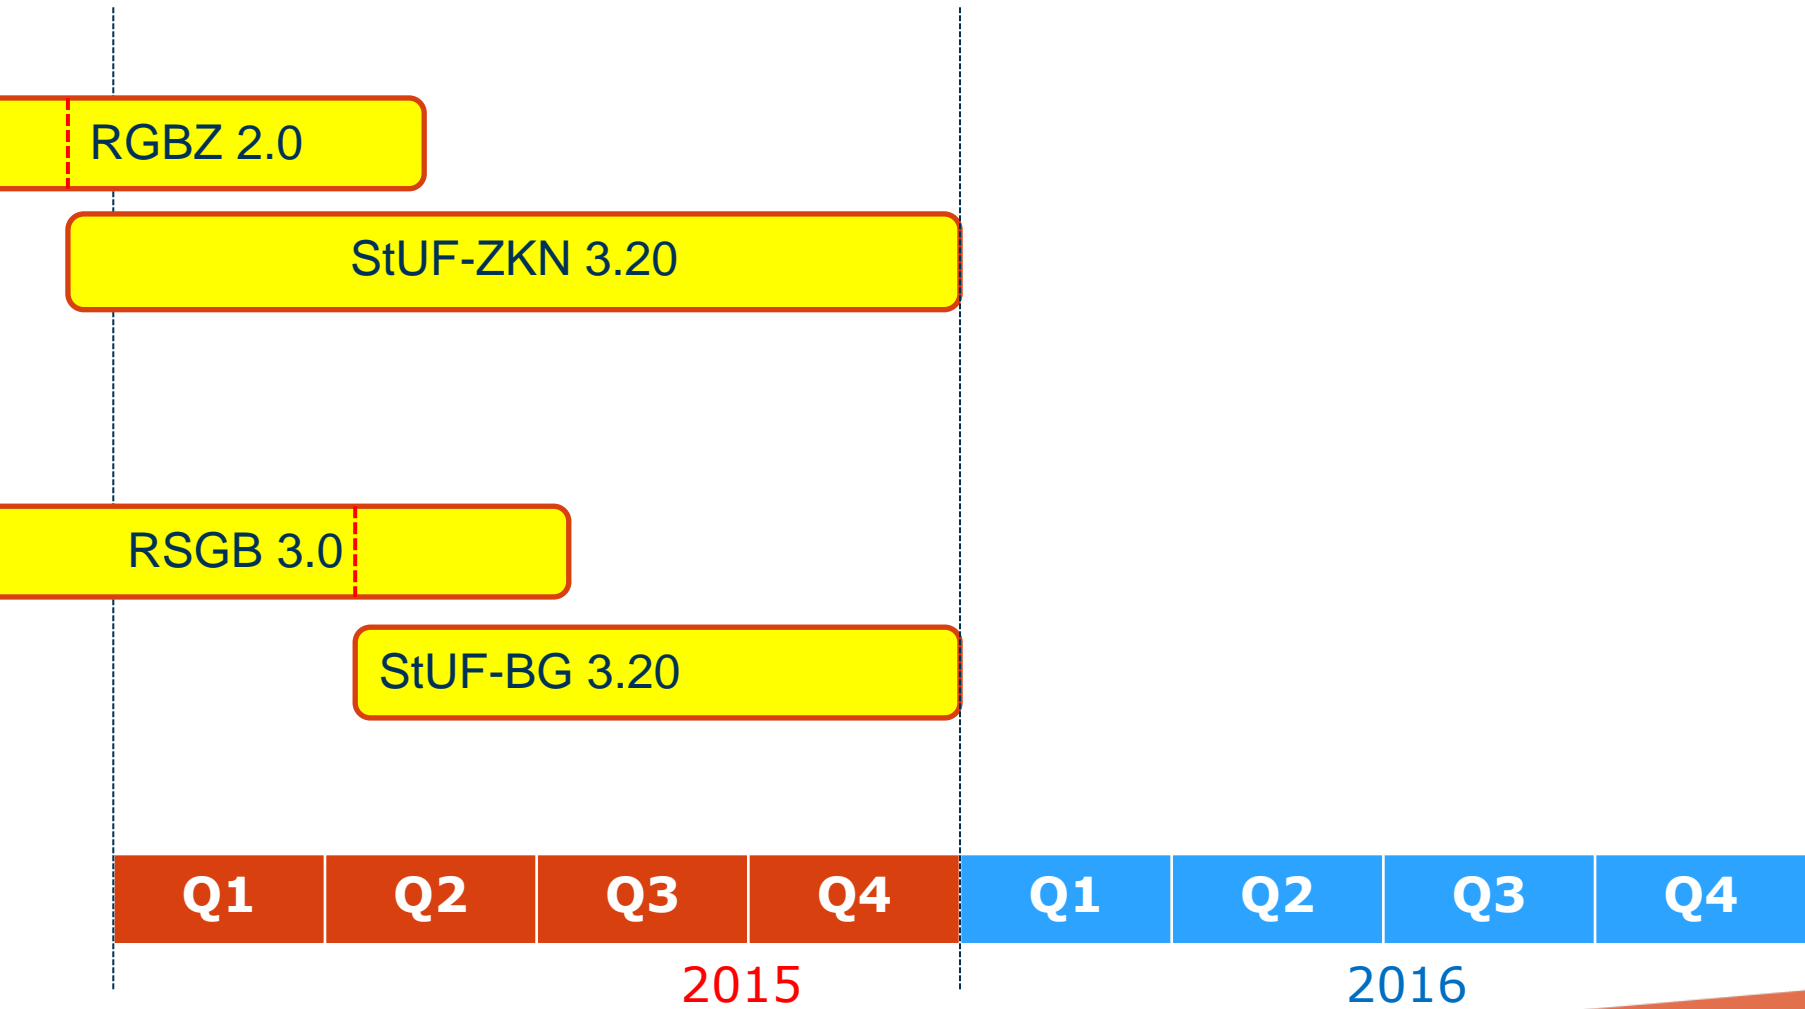

Stand van zaken StUF Expertgroep

- StUF-ZKN 3.20
 - Berichtontwerpen (KeuzenVerStUffingRGBZ2.0.pdf)
 - Opgeleverd in maart 2015
 - 75% berichtdiagrammen goedgekeurd
- StUF-BG 3.20
 - RFC0387 (watervaldiscussie) afgerond
- StUF 3.02:
 - Zie volgende slide

34 RFC's op StUF 3.01 beoordeeld

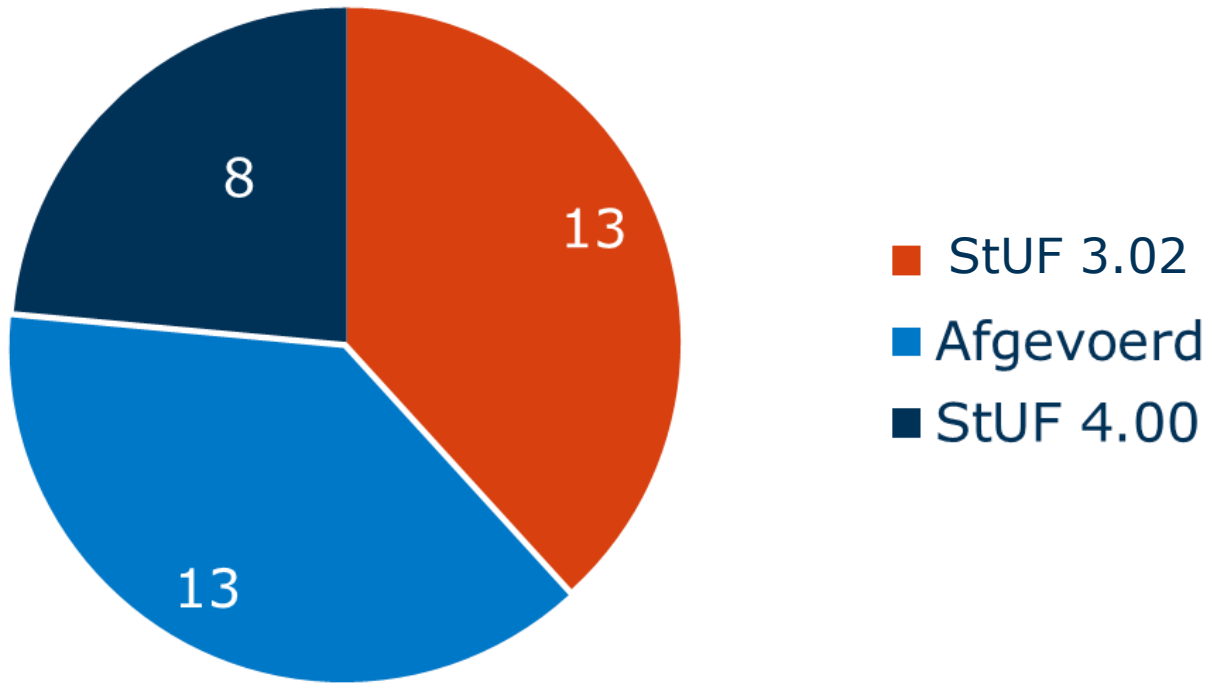


StUF 3.02 (13 van 34 RFC's)

Issue-id	Title
RFC0112	Definieer een speciaal element <isEen> tbv subtypering
RFC0121	Gelijktrekken datums met stelseldefinitie (GAB)
RFC0123	Stuurgegevens stuf:functie van 30 naar 80 posities
RFC0126	Optioneel verklaren van gebruik attribuut stuf:functie in vrije berichten ...
RFC0145	Specificatie niet voorkomen relatie niet goed geïmplementeerd in sectormodellen
RFC0146	Opnemen kerngegevens in synchronisatieberichten
RFC0152	Ontbrekende foutcode in de StUF standaard
RFC0155	Toevoegen 'StUF:functie' attribute aan attributegroup 'StUF:entiteit'
RFC0324	Samenvoegen Bv03 en Bv04 in één berichtsoort
RFC0333	Extra verbeteringen synchronisatieberichten
RFC0343	Zoeken met StUF-BG op delen van woorden zoals bedrijfsnaam
RFC0345	Patchnummer in een bericht
RFC0385	Waardenbereik XML-attribuut "entiteittype" uitbreiden met namespace qualifier.


Bevindingen

- StUF 3.02
 - Veel behoefte aan deze nieuwe onderlaag
 - EG wil meer dan alleen laaghangend fruit
- StUF-BG 3.20
 - Oplevering RSGB uitgelopen en StUF-analyse laat gestart.
- StUF-ZTC 3.20
 - Afhankelijk van StUF 3.02
- StUF-ZKN 3.20
 - Afh. Van StUF 3.02, StUF-BG 3.20 en StUF-ZTC 3.20

Afhankelijkheden

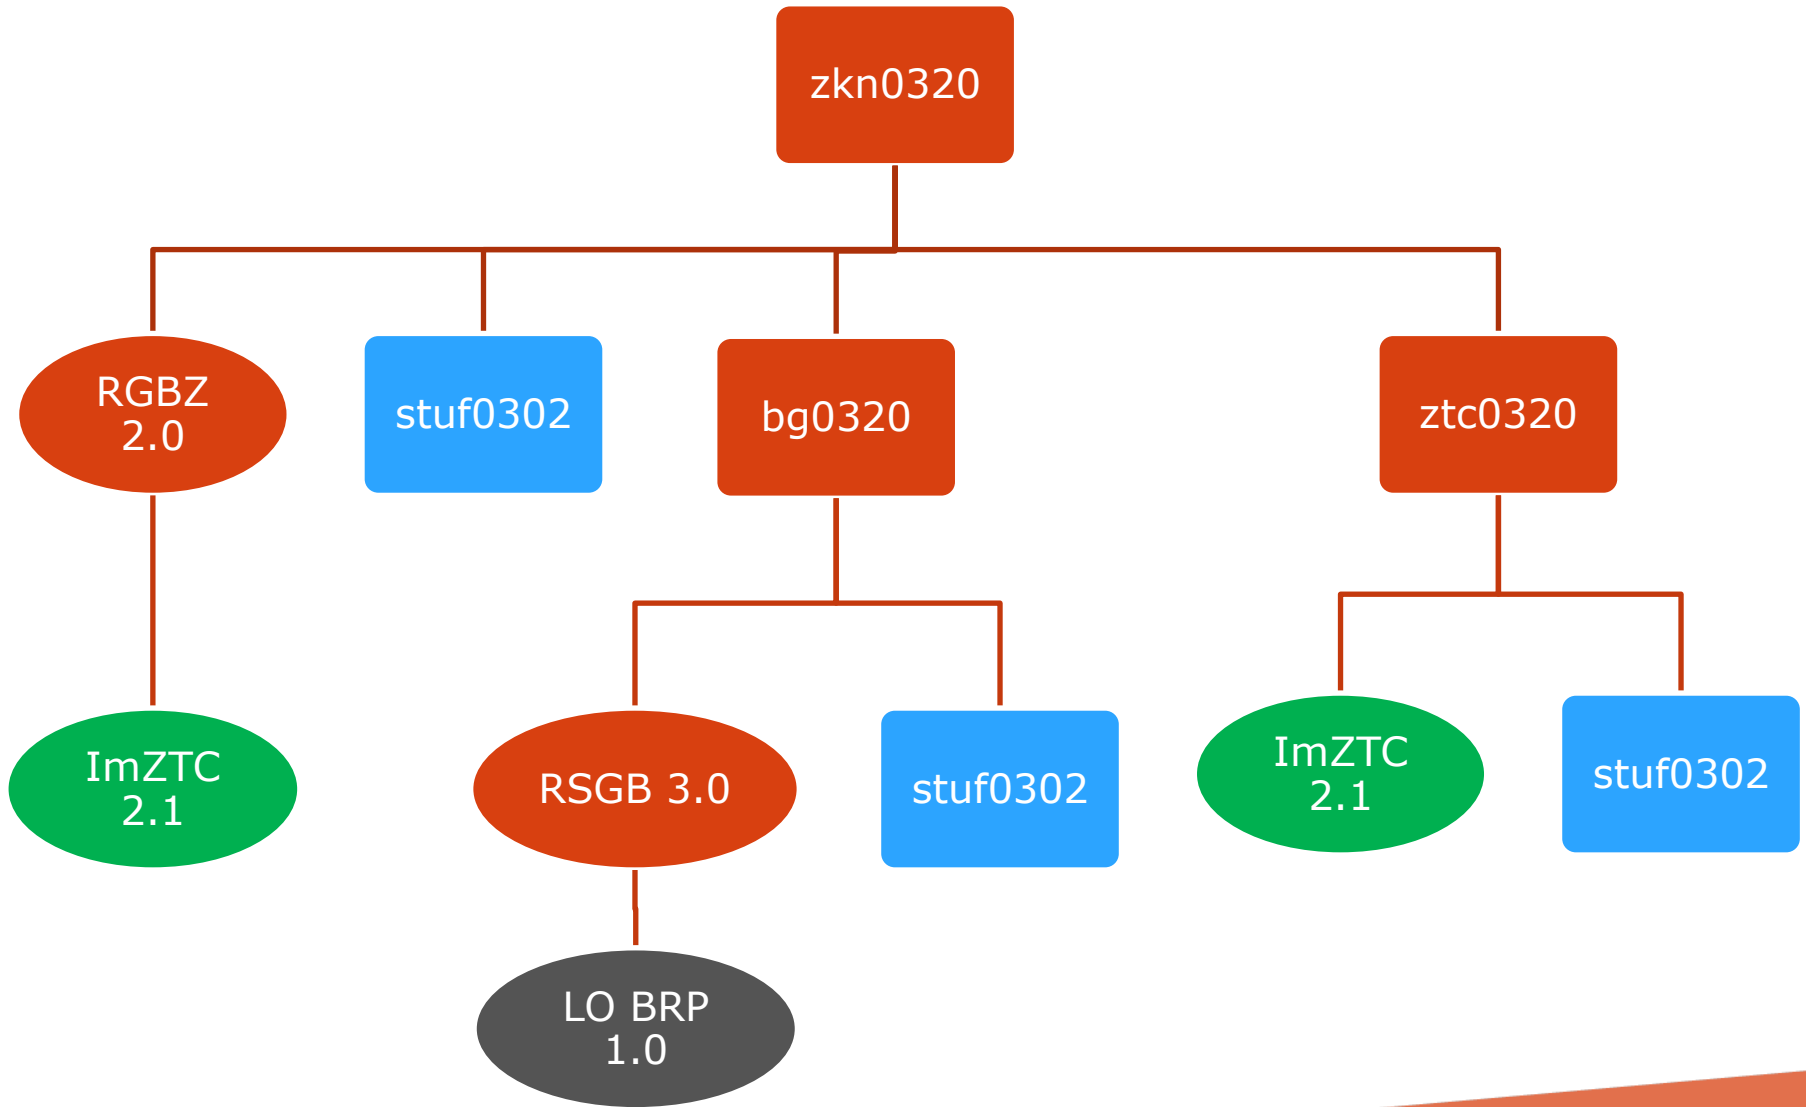

Reguliere ontwikkelproces sectormodel

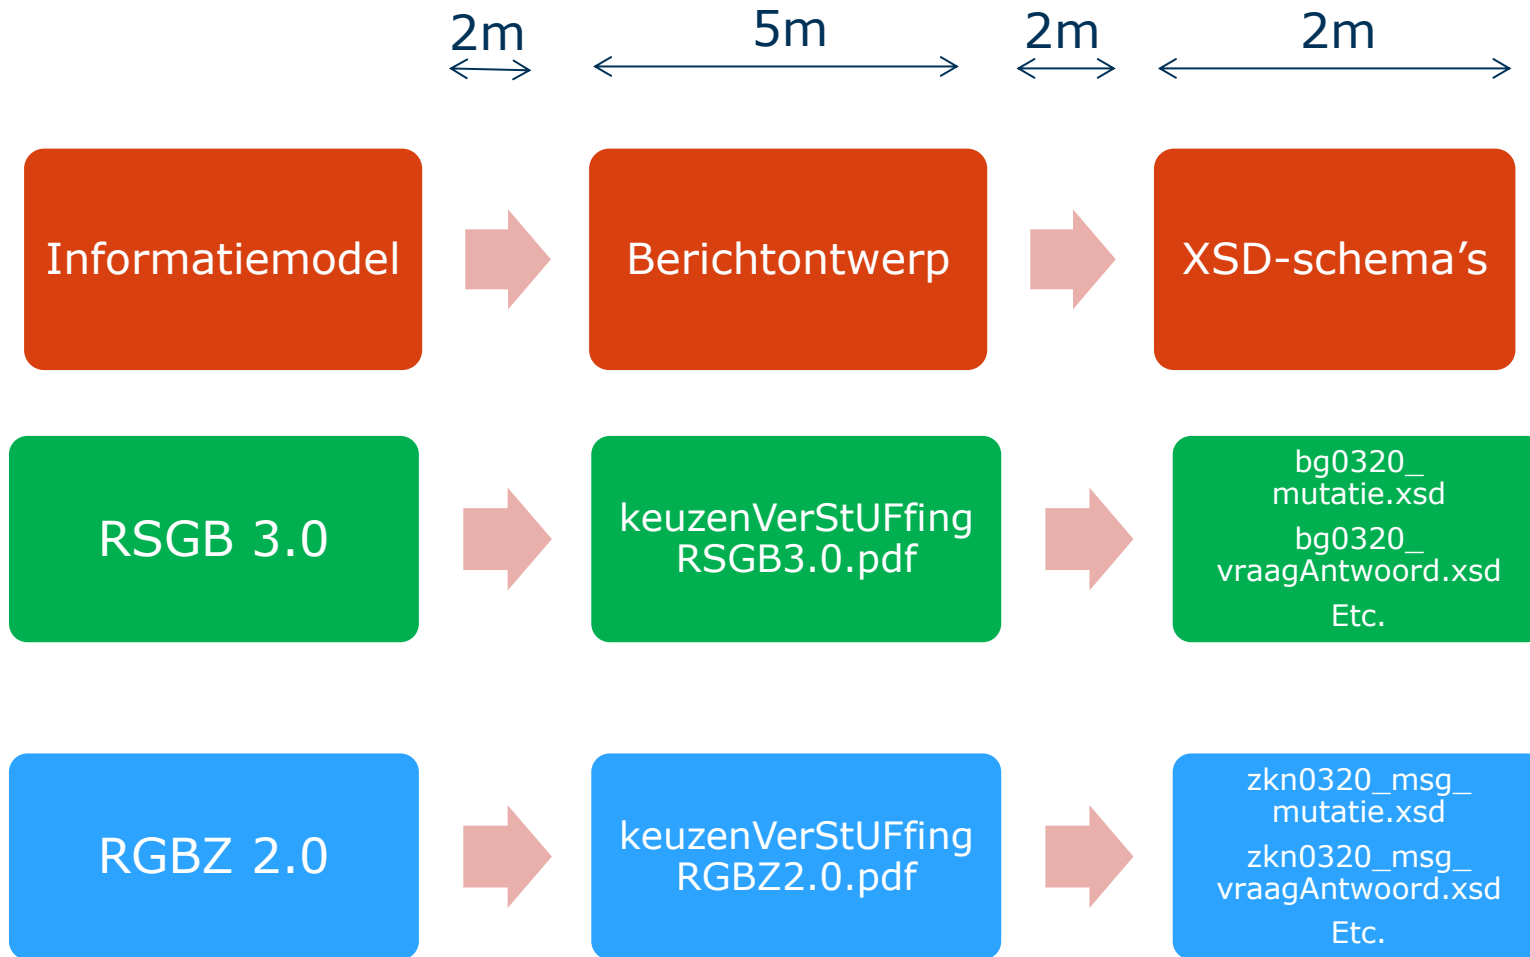

Capaciteit StUF Expertgroep

- Maandelijksse bijeenkomst
 - Derde woensdag van de maand
- Vergadertijd 9.30 tot 12.30 (3 uur)
- 9 meetings per jaar
 - Juli en augustus (zomervakantie)
 - Februari (krokusvakantie)

Conclusie:

Gezien de uitloop van RSGB3.0, de laat gestarte StUF-analyse en de behoefte aan StUF 3.02 gaan we de planning met het reguliere ontwikkel- c.q. standaardisatieproces niet halen!

Vragen voor de regiegroep:

- Is de roadmap nog steeds urgent?
- Zo ja, wat zijn de versnellingsmogelijkheden?

Versnellingsmogelijkheden

1. Extra vergaderingen inplannen
2. Langer vergaderen
3. Vergaderingen meer voorbereiden
4. Extra resources inhuren en vrij maken
5. Koppelvlakken lostrekken uit sectormodellen
6. Agenda EG beperken
 - Minder patches
 - Minder openbare consultaties
7. Leveranciers intensiever betrekken bij IM
8. Meer online discussie
9. Tooling (generatiescripts)
