


# ***Roadmap StUF***

Henri Korver  
StUF Regiegroep 4 juni 2015  
La Vie, Utrecht


# Roadmap StUF

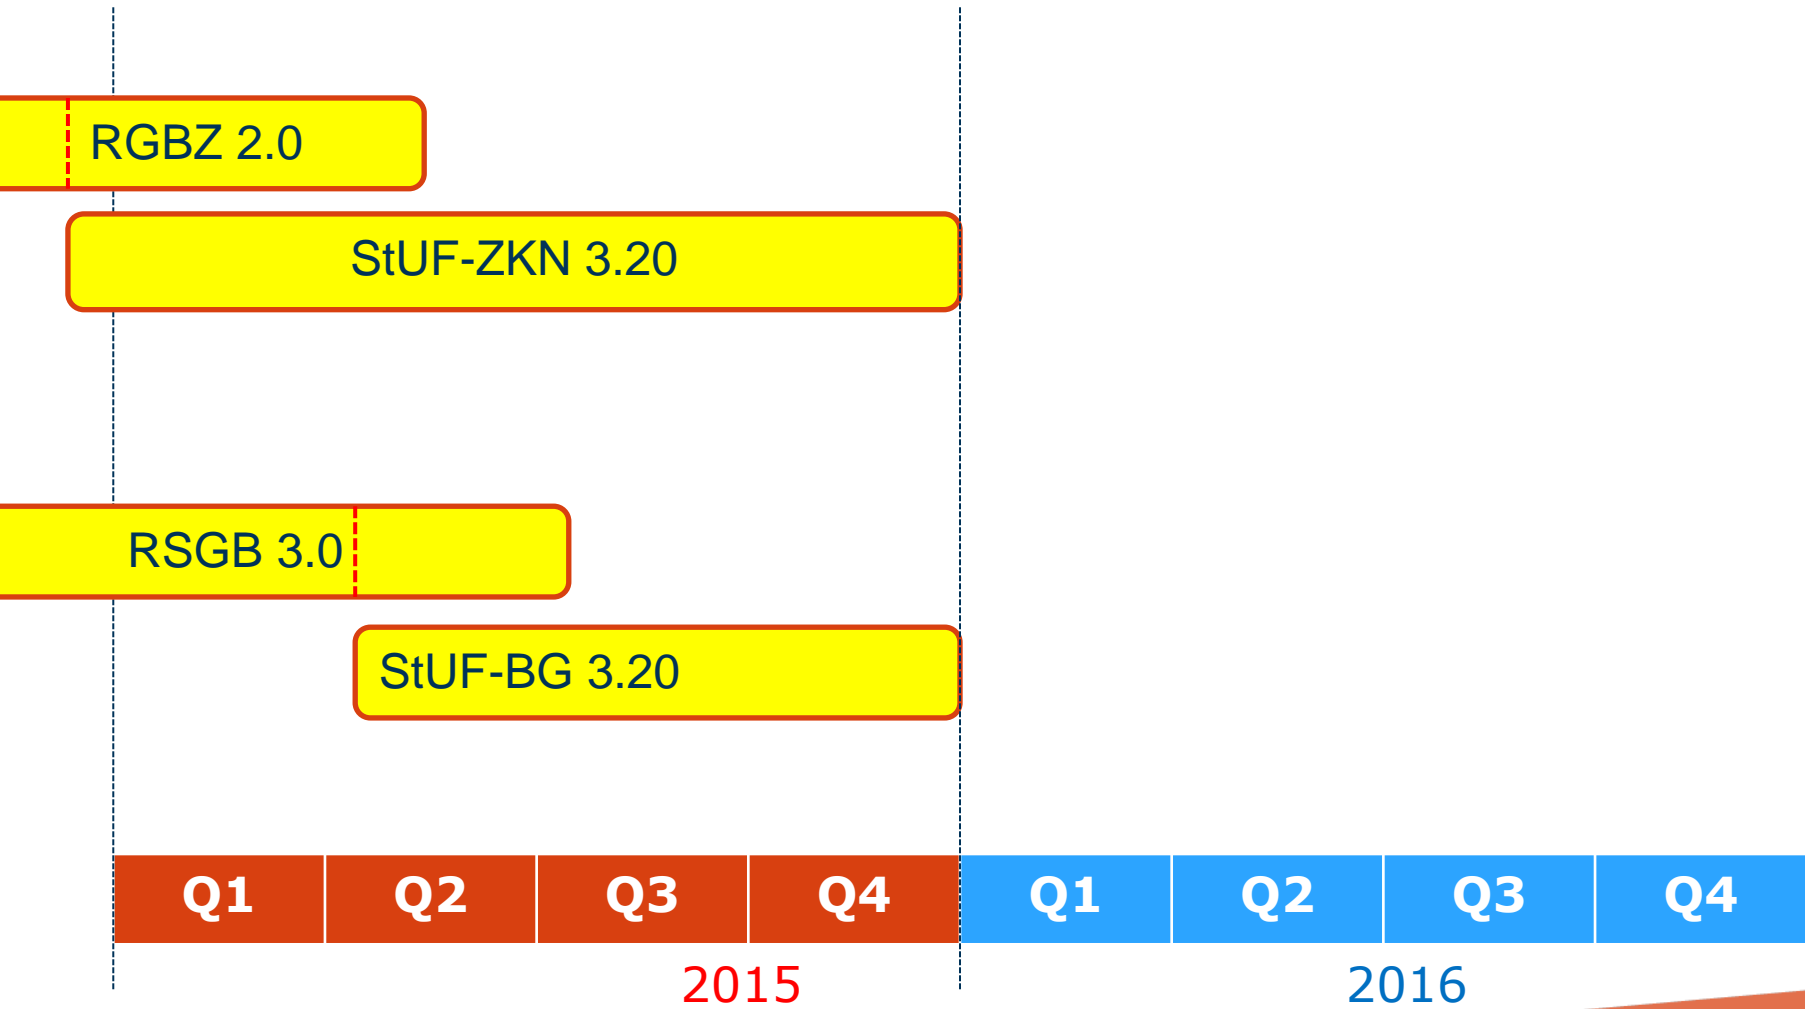

## Stand van zaken StUF Expertgroep

- StUF-ZKN 3.20
  - Berichtontwerpen (KeuzenVerStUffingRGBZ2.0.pdf)
    - Opgeleverd in maart 2015
    - 75% berichtdiagrammen goedgekeurd
- StUF-BG 3.20
  - RFC0387 (watervaldiscussie) afgerond
- StUF 3.02:
  - Zie volgende slide

## 34 RFC's op StUF 3.01 beoordeeld

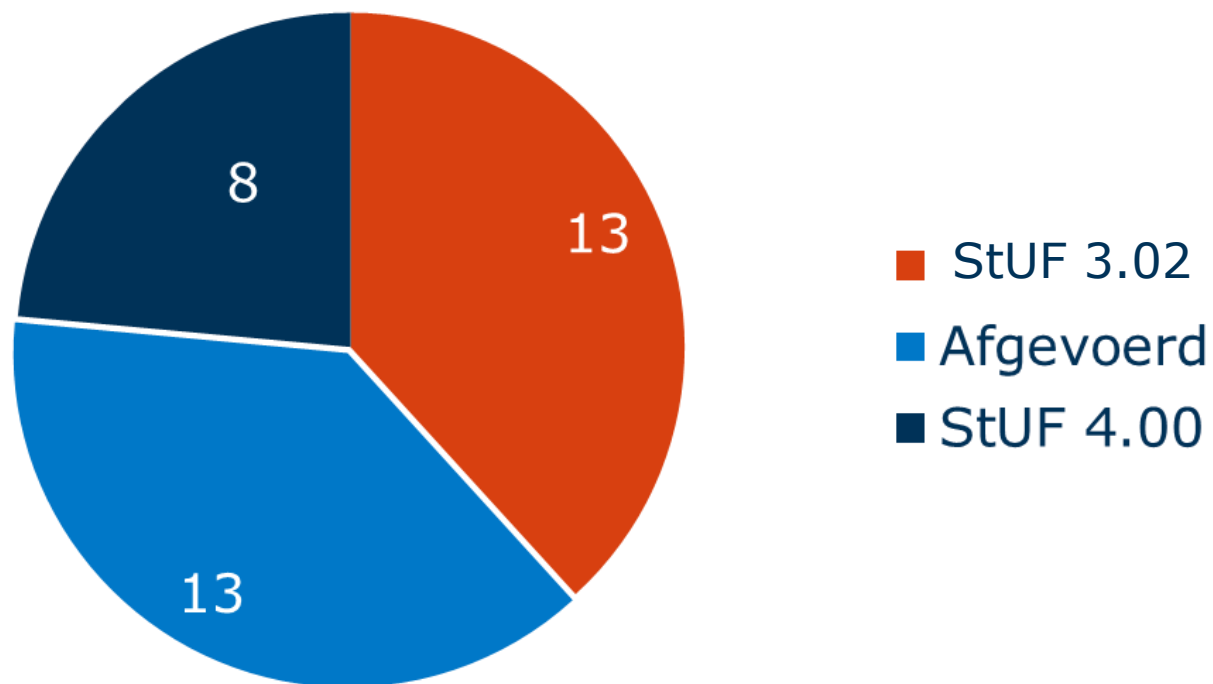


## StUF 3.02 (13 van 34 RFC's)

Issue-id	Title
RFC0112	Definieer een speciaal element <isEen> tbv subtypering
RFC0121	Gelijktrekken datums met stelseldefinitie (GAB)
RFC0123	Stuurgegevens stuf:functie van 30 naar 80 posities
RFC0126	Optioneel verklaren van gebruik attribuut stuf:functie in vrije berichten ...
RFC0145	Specificatie niet voorkomen relatie niet goed geïmplementeerd in sectormodellen
RFC0146	Opnemen kerngegevens in synchronisatieberichten
RFC0152	Ontbrekende foutcode in de StUF standaard
RFC0155	Toevoegen 'StUF:functie' attribute aan attributegroup 'StUF:entiteit'
RFC0324	Samenvoegen Bv03 en Bv04 in één berichtsoort
RFC0333	Extra verbeteringen synchronisatieberichten
RFC0343	Zoeken met StUF-BG op delen van woorden zoals bedrijfsnaam
RFC0345	Patchnummer in een bericht
RFC0385	Waardenbereik XML-attribuut "entiteittype" uitbreiden met namespace qualifier.


# Bevindingen

- StUF 3.02
  - Veel behoefte aan deze nieuwe onderlaag
  - EG wil meer dan alleen laaghangend fruit
- StUF-BG 3.20
  - Oplevering RSGB uitgelopen en StUF-analyse laat gestart.
- StUF-ZTC 3.20
  - Afhankelijk van StUF 3.02
- StUF-ZKN 3.20
  - Afh. Van StUF 3.02, StUF-BG 3.20 en StUF-ZTC 3.20

# Afhankelijkheden

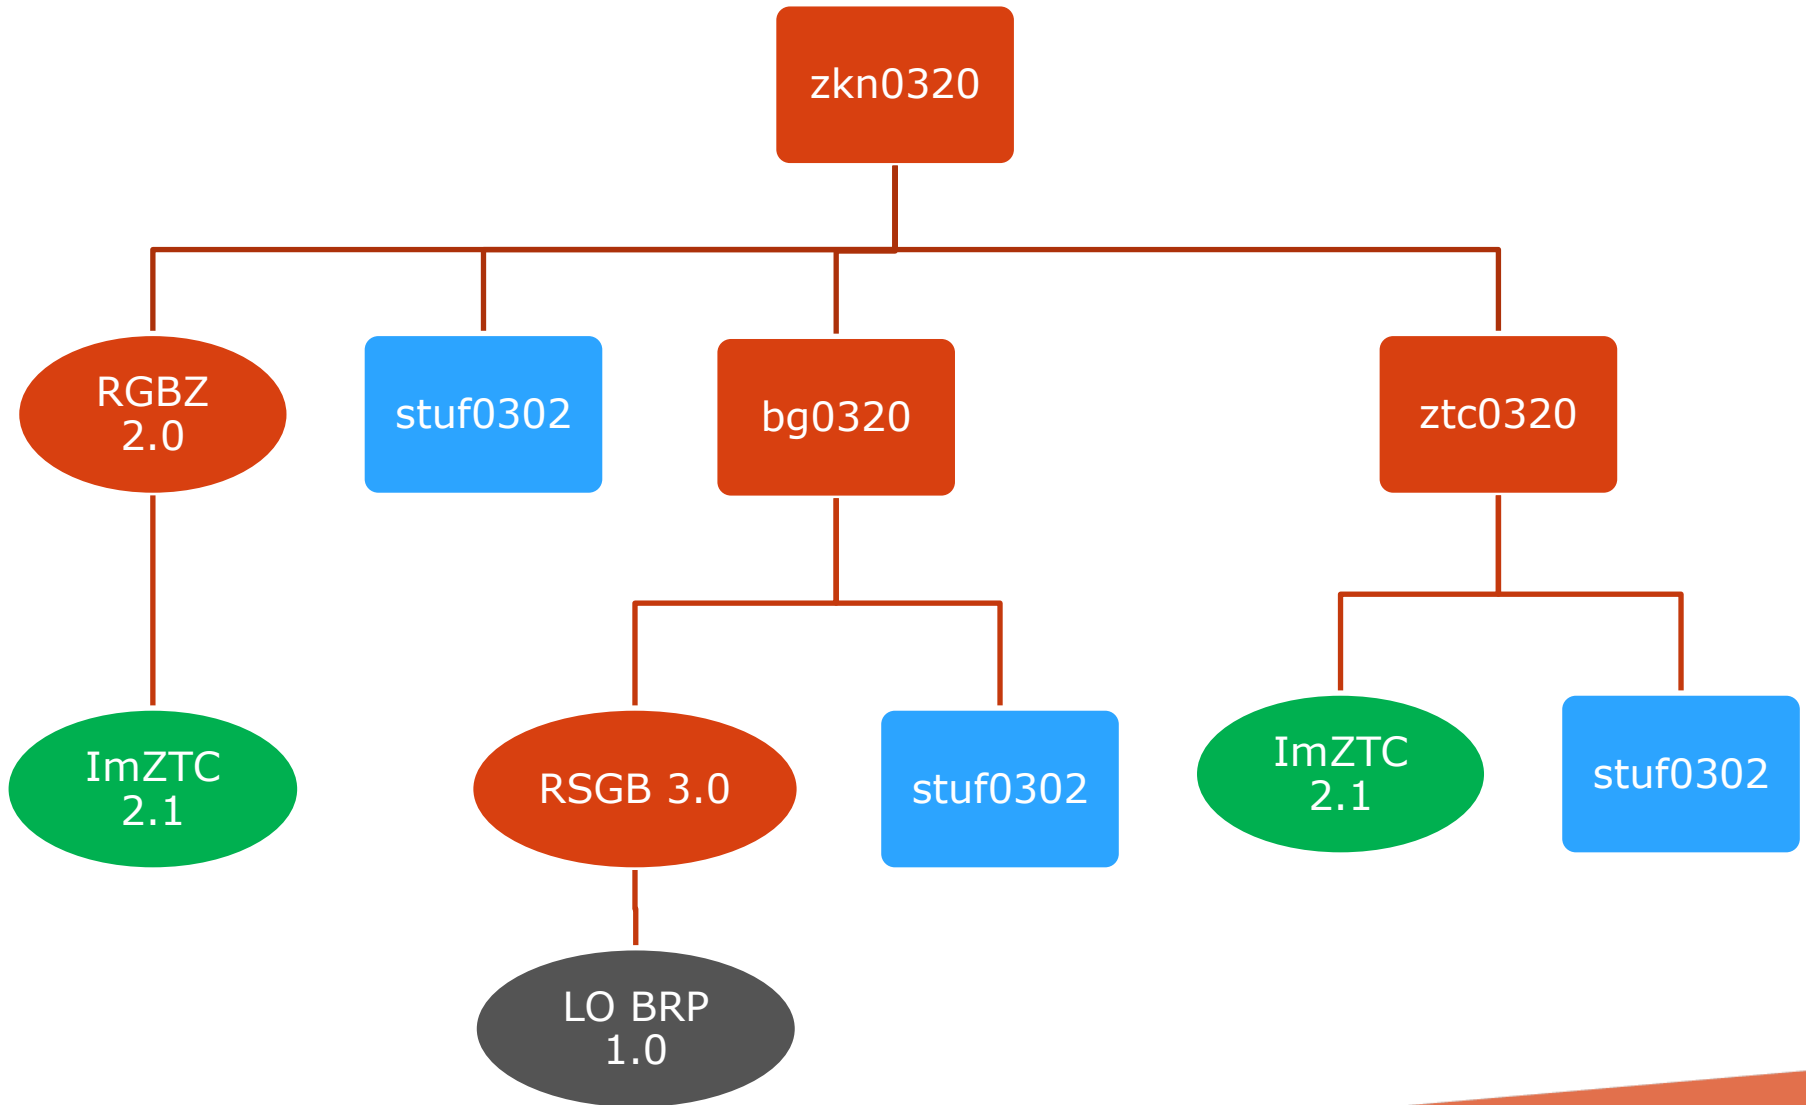

# Reguliere ontwikkelproces sectormodel

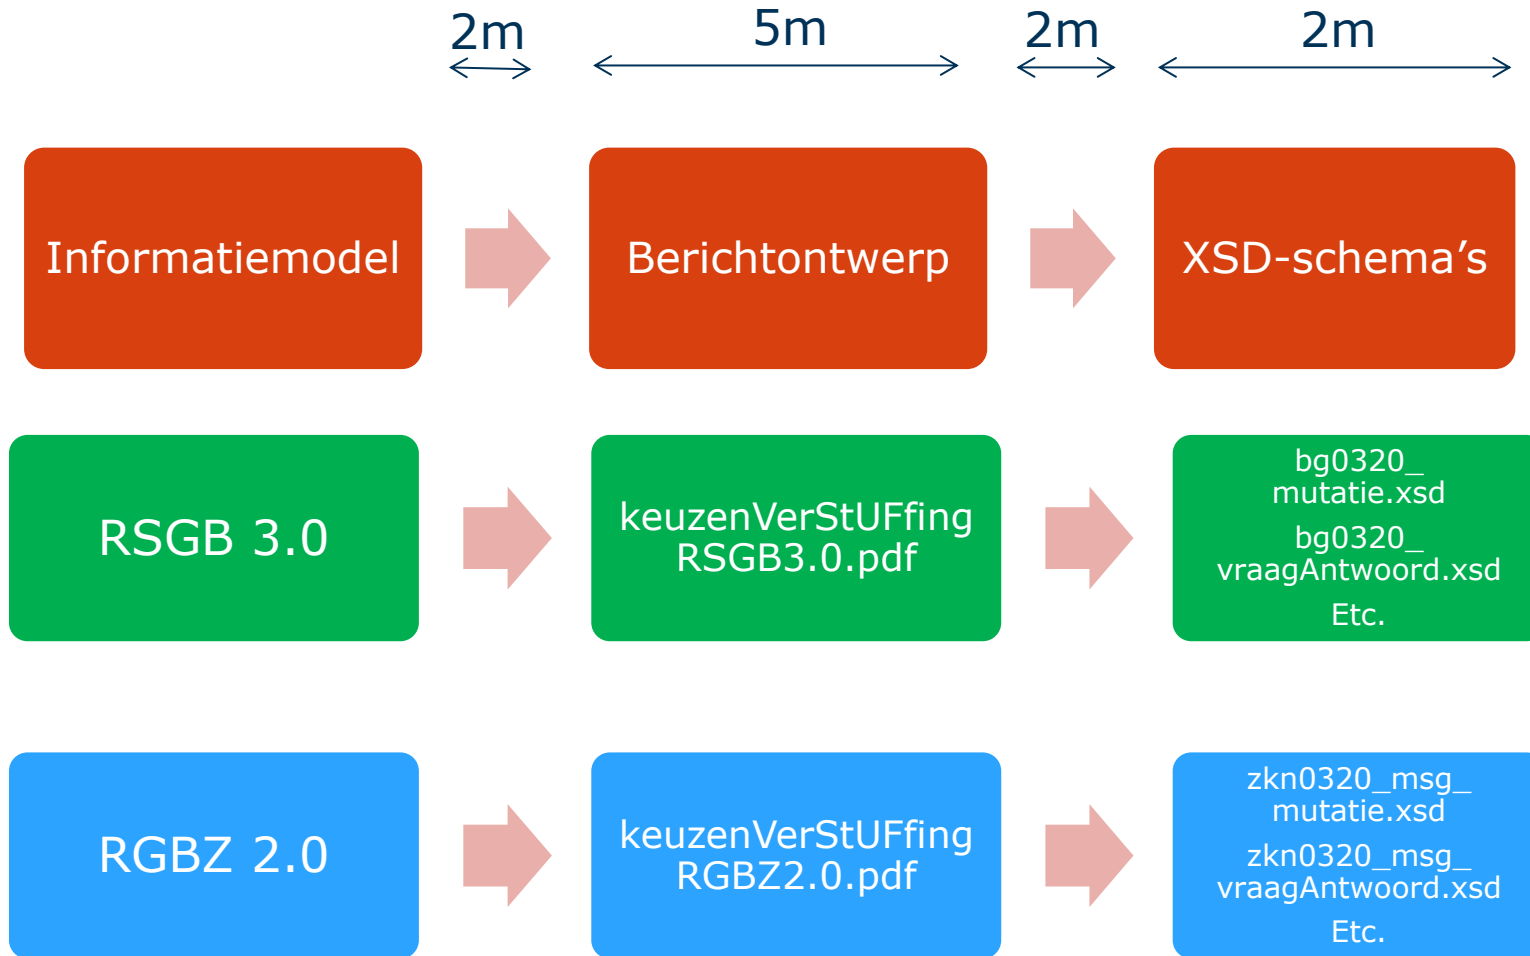



## Capaciteit StUF Expertgroep

- Maandelijksse bijeenkomst
  - Derde woensdag van de maand
- Vergadertijd 9.30 tot 12.30 (3 uur)
- 9 meetings per jaar
  - Juli en augustus (zomervakantie)
  - Februari (krokusvakantie)

## **Conclusie:**

**Gezien de uitloop van RSGB3.0, de laat gestarte StUF-analyse en de behoefte aan StUF 3.02 gaan we de planning met het reguliere ontwikkel- c.q. standaardisatieproces niet halen!**

## **Vragen voor de regiegroep:**

- Is de roadmap nog steeds urgent?
- Zo ja, wat zijn de versnellingsmogelijkheden?

# Versnellingsmogelijkheden

1. Extra vergaderingen inplannen
2. Langer vergaderen
3. Vergaderingen meer voorbereiden
4. Extra resources inhuren en vrij maken
5. Koppelvlakken lostrekken uit sectormodellen
6. Agenda EG beperken
  - Minder patches
  - Minder openbare consultaties
7. Leveranciers intensiever betrekken bij IM
8. Meer online discussie
9. Tooling (generatiescripts)
